

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

| | |
|---|---|
| Názov projektu | ISRMO – OPBK - Senec – „Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy J.G. Tajovského v Senci“ |
| Kód ITMS | 22310120099 |
| Prijímateľ (názov a sídlo) | Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec |
| Operačný program | Bratislavský kraj |
| Prioritná os | 1 - Infraštruktúra |
| Opatrenie | 1.1 Regenerácia sídiel |
| Skupina aktivít | 1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí |
| Kód výzvy | OPBK/2013/1.1./12-ISRMO |
| Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis | - |

| 1. Miesto realizácie projektu | | | |
|-------------------------------|-------|------------------|-------|
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| Senec | Senec | Mierové námestie | 8 |

| 2. Finančný a časový rámec realizácie projektu | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) | Začiatok realizácie aktivít projektu | Ukončenie realizácie aktivít projektu |
| | 09/2014 | 01/2015 |
| Výdavky projektu (v EUR) | Celkové oprávnené výdavky | 557 291,70 |
| | Z toho NFP | 529 427,11 |
| | Vlastné zdroje | 27 864,59 |

| 3. Stručný opis projektu ¹ |
|--|
| <p>Po ukončení realizácii projektu sa celkovo odstránil zlý technický stav budovy školy, ako aj budovy školskej jedálne, čo viedlo k zvýšeniu štandardu poskytovaných služieb v procese vzdelávania. Celkovo po ukončení projektu sa zlepšili materiálno-technické podmienky školy, čím sa naplnil cieľ projektu.</p> <p>Projekt bol realizovaný nasledovnými aktivitami:</p> <p>HA1: Zateplenie hlavnej budovy a školskej jedálne:</p> <p>A1: Zateplenie budovy a výmena odkvapového systému a A2: Bleskozvod</p> <p>HA 2: Rekonštrukcia inžinierskych sietí:</p> |

¹ rozpísať maximálne na 800 znakov

² v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísať príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke

A3: Rekonštrukcia kanalizačného systému a A4: Rekonštrukcia elektrickej inštalácie

HA3: Rekonštrukcia školskej jedálne:

A 5: Úprava skladových priestorov, A6:Rekonštrukcia varne a A7:Rekonštrukcia sociálnych zariadení v školskej jedálni

HA4: A 8:Rekonštrukcia sociálnych zariadení v prístavbe

4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu


| | |
|---|--|
| Cieľ projektu | Zlepšením technického stavu budovy zvýšiť štandard poskytovaných služieb v procese vzdelávania. |
| Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov | Projektom sa dosiahlo: <ol style="list-style-type: none">1. Zateplením budovy sa zlepšili podmienky v interiéri budovy (HA1)2. Rekonštrukciou IS sa zlepšilo životné prostredie a zvýšila sa bezpečnosť budovy (HA2)3. Rekonštrukciou školskej jedálne sa zvýšila kvalita služieb, zlepšili sa hygienické podmienok v jedálni a pracovné podmienky zamestnancov kuchyne (HA3)4. Zlepšili sa hygienické podmienky v sociálnych zariadeniach (HA4) Merateľné ukazovatele výsledku: <ul style="list-style-type: none">- Celková plocha technicky zhodnotených objektov – 6 542,11 m²- Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest – 1- Počet technicky zhodnotených objektov - 1- Zateplená plocha – 6 357,02 m²- Zníženie energetickej náročnosti budov – 167,0 kWh/m² |

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP²

| | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|--------------------|
| Popis príspevku k cieľom HP | Projekt svojim zameraním naplňa ciele HP TUR nasledovne : Modernizáciou a rekonštrukciou školy sa zlepšili podmienky pre výučbu, celkovo sa skvalitnil pedagogický proces, čo prispelo k naplneniu cieľov HP TUR. HP TUR je naplnená najmä technickým zdokonalením budovy. | | | |
| Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP | Názov ukazovateľa a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
| | Zníženie energetickej náročnosti budov | 0,00 | 121,6 | 167,0 |
| Popis príspevku k cieľom HP | HP rovnosť príležitostí : Projektový návrh je v súlade s cieľom tejto priority, nakoľko školu navštevujú 3 deti s poruchami učenia a 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia . Škola svojím prístupom a svojím vzdelávacím programom podporuje rovnosť všetkých žiakov. V školskej jedálni sa stravujú aj dôchodcovia a sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva , čím projekt prispieva aj k sociálnej inklúzii týchto cieľových skupín. | | | |
| Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP | Názov ukazovateľa a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
| | Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest | 0 | 1 | 1 |

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu

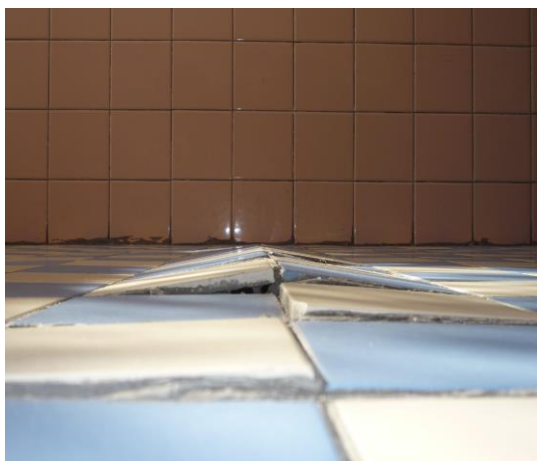

Situácia počas realizácie aktivít projektu





Situácia po ukončení realizácie aktivít





